


케이지 탈락과 함께 떨어짐

공 사 명	0000 신축공사	발생일시	2020.01.22.(수) 13:30경
재해형태	떨 어 짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	〇〇시 〇〇구	공사규모	지하3층,지상111층, 4개동
재해개요	2020. 01. 22(수) 13:30경 〇〇 00구 소재한 0000(주)가 시공 중인 「0000 신축 공사」 현장에서 협력업체 00건설(주) 소속 작업자인 000(만 50세, 남, 형틀공)이 00동 지상5층 슬라브에서 타워크레인으로 인양된 테이블서포트)의 슬링벨트 해제를 위해 지상5층 슬라브 외곽부에 설치된 케이지(작업발판)에 올라 테이블서포트 쪽으로 이동 중 슬라브에서 케이지가 탈락되며 케이지와 함께 지상1층 바닥으로(H≒21m)로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

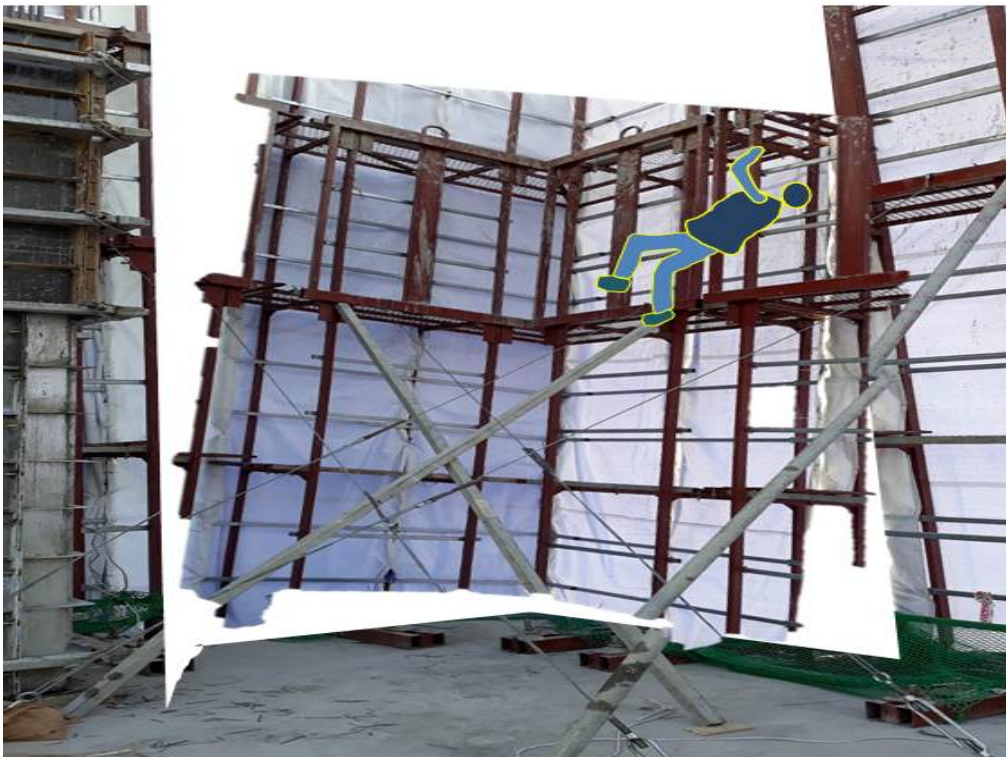

안전대책

○ 중량물 취급작업 계획서 작성

- 사업주는 중량물 취급작업시 작업자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업으로 인한 작업자의 추락, 낙하, 전도, 충돌 등을 사고를 예방하기 위한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.

○ 작업지휘자 지정

- 작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 함.



※ 케이지 탈락시 피해자는 케이지와 같이 1층으로 떨어짐
