
미끄러지는 차량에 끼임

공 사 명	00하수관로정비 사업	발생일시	2020. 1. 10.(금) 10:8분경
재해형태	끼임	재해정도	사망 1명
소 재 지	부산시 동구	공사규모	하수관로 70,547m 우수관로 3,757m 배수설비 13,025개소
ᄪᆒᆒ	2020. 1. 10.(금) 오전 10시 8분경 부산시 동구 소재 하수관로 정비 현장에서 재해자는 파쇄된 콘크리트 등을 덤프트럭에 싣기 위해 차량 시동 후 하차하여 고임목을 제거하였고, 차량이 경사진 도로 전방으로 미끄러지자 차량을 정지		
재해개요 	시키려하다 벽과 덤프트럭 사이에 끼여 사망한 재해임. ※ 재해자는 처랑하차 시 주차브레이크를 완전히 체결하지 않거나, 미 체결한 것으로 추정됨		

상 황 도 재 해

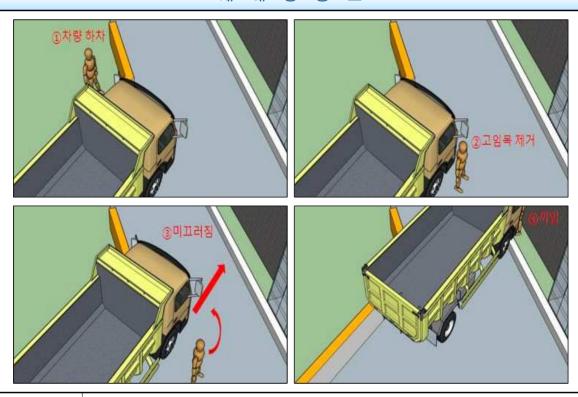

○ 운전위치 이탈 시 차량 이탈방지 조치 실시

- 차량계 건설기계의 운전자가 운전위치를 이탈하는 경우 차량의 원동기를 정지시키고 주차브레이크 등을 확실히 거는 등 갑작스러운 주행이나 이탈을 방지하기 위한 조치 실시

안전대책

○ 사전조사 실시 및 작업계획 근로자에게 주지

- 차량계 건설기계를 사용하는 작업 시 근로자의 위험을 방지하기 위해 해당 작업장소의 지형 및 지반상태에 대한 사전조사 후, 조사 결과를 고려하여 차량계 건설기계의 운행경로 및 작업방법을 정하고 근로자에게 주지하여 계획에 따라 작업하도록 조치
