

지붕 보수 작업 중 떨어짐

공 사 명	인천 남동구 공장지붕 보수공사	발생일시	2019.08.08.(목) 07:40경
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 남동구	공사규모	1층 지붕보수
재해개요	2019년 8월 8일(목) 07:40 경 인천 남동구 소재 공장보수공사 현장에서 00소속 근로자(만 50세,남,판넬공)가 공장지붕 위에서 보수공사 작업도중 공장지붕 채광판이 깨지면서 공장내부 1층 바닥으로 떨어져(H≒8.2m) 병원으로 후송하여 치료 중 8월 10일 11:15경 사망한 재해임		

재 해 상 황 도




안전대책

- 지붕에서의 위험방지 실시
 사업주는 슬레이트, 선라이트(sunlight) 등 강도가 약한 재료로 덮은 지붕 위에서 작업을 할 때에 발이 빠지는 등 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 폭 30센티미터 이상의 발판을 설치하거나 안전방망을 치는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함

- 안전대의 부착설비 설치
 사업주는 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 함.



재해자 상부추락지점

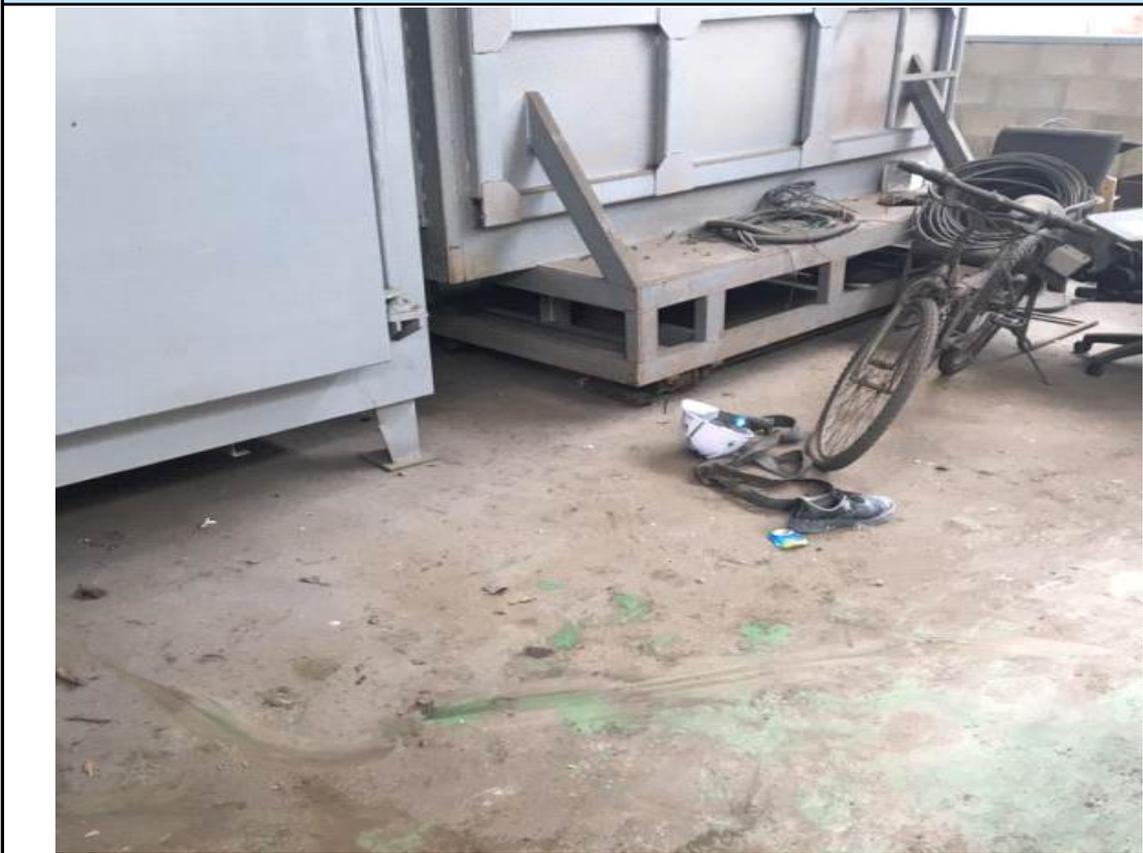

재해자 하부추락지점
