


**스트럿 상부에서 볼트해체 작업 중 추락 사망**

공사명	00동 비즈니스호텔 신축공사	발생일시	2018.09.28(금) 09:26경
재해형태	추락	재해정도	사망 1명
소재지	서귀포시 00동	공사규모	지하4층 지상11층
재해개요	2018년 09월 28일(금) 09:26경 서귀포시 00동 소재 비즈니스호텔 신축공사 현장에서 피해자가 연결볼트가 해체된 스트럿 상부에서 띠장 접속부 볼트해체 작업(추정) 중 스트럿이 띠장에서 이탈되며 약 3.3m아래 콘크리트 바닥으로 떨어져 이송 치료 중 사망한 재해임		

**재해상황도**

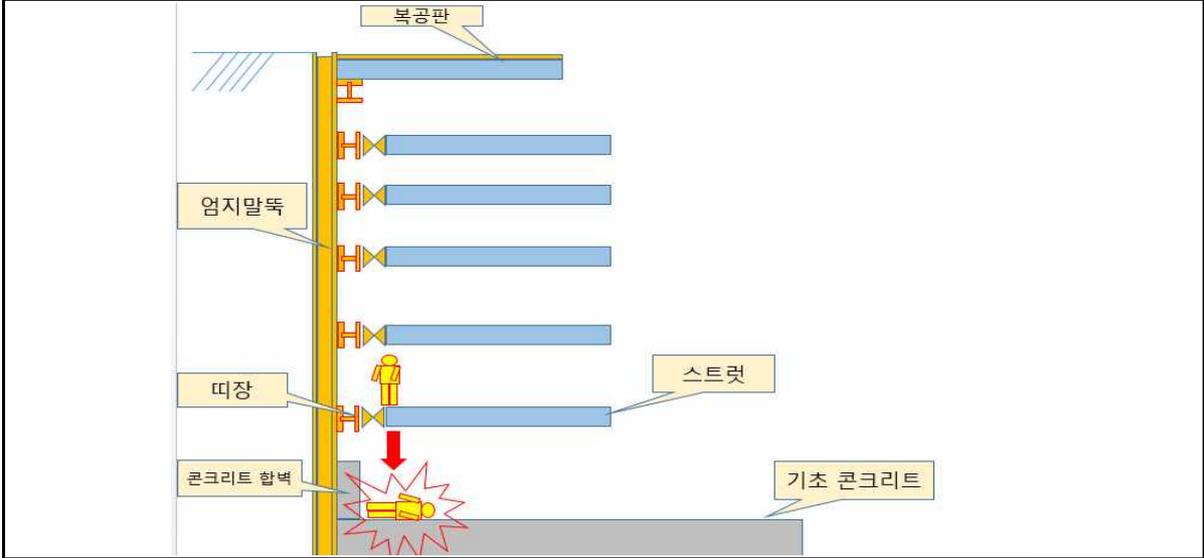

안전대책	<p><b>- 추락방지조치 실시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 안전난간 및 안전방망을 설치할 수 없이 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전대 부착설비를 설치하고, 근로자는 안전대를 착용·부착하여 작업하도록 하여야 함</li> <li>· <b>※ 안전대 부착설비는 추락시 쥘길이에 의한 충돌방지를 위하여 머리 높이 위로 설치해야함</b></li> <li>· 안전대 부착설비 등의 안전시설물은 부재해체작업 직전까지 존치시켜, 해체작업중인 근로자가 부착할 수 있도록 작업계획서 검토</li> <li>· 이동하는 띠장구간에도 안전대를 부착하고 이동할 수 있도록, 띠장 상부에 안전대 부착설비 설치</li> </ul> <p><b>- 중량물취급작업계획서 작성 및 주지교육 실시</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업주는 중량물 취급작업을 하는 경우 해당 작업 중 추락, 낙하, 전도, 협착 및 붕괴재해예방을 위한 안전대책을 작성하고, 그 내용을 해당 작업자에게 주지시켜 작업을 하여야하며</li> <li>· 작성시에는 현장여건을 반영하여 현장적용성을 확보할 수 있는 계획서를 작성하여야 함</li> </ul>
------	---
