


작업발판 미고정으로 거꾸집 조립작업 중 떨어짐

공 사 명	000 단독주택 신축공사	발생일시	2016.10.03
재해형태	떨어짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	전남 00시 00동	공사규모	지상 3층 근생 및 다가구주택
재해개요	2016.10.03. 08:07경 전남 00시 00동 소재 근생 및 다가구주택 신축공사 현장에서 피해자가 외부 쌍줄비계 작업발판(5단) 위에서 지상 3층 벽체 거꾸집 조립작업을 실시하던 중 작업발판이 탈락되면서 약 9m 아래로 떨어져 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

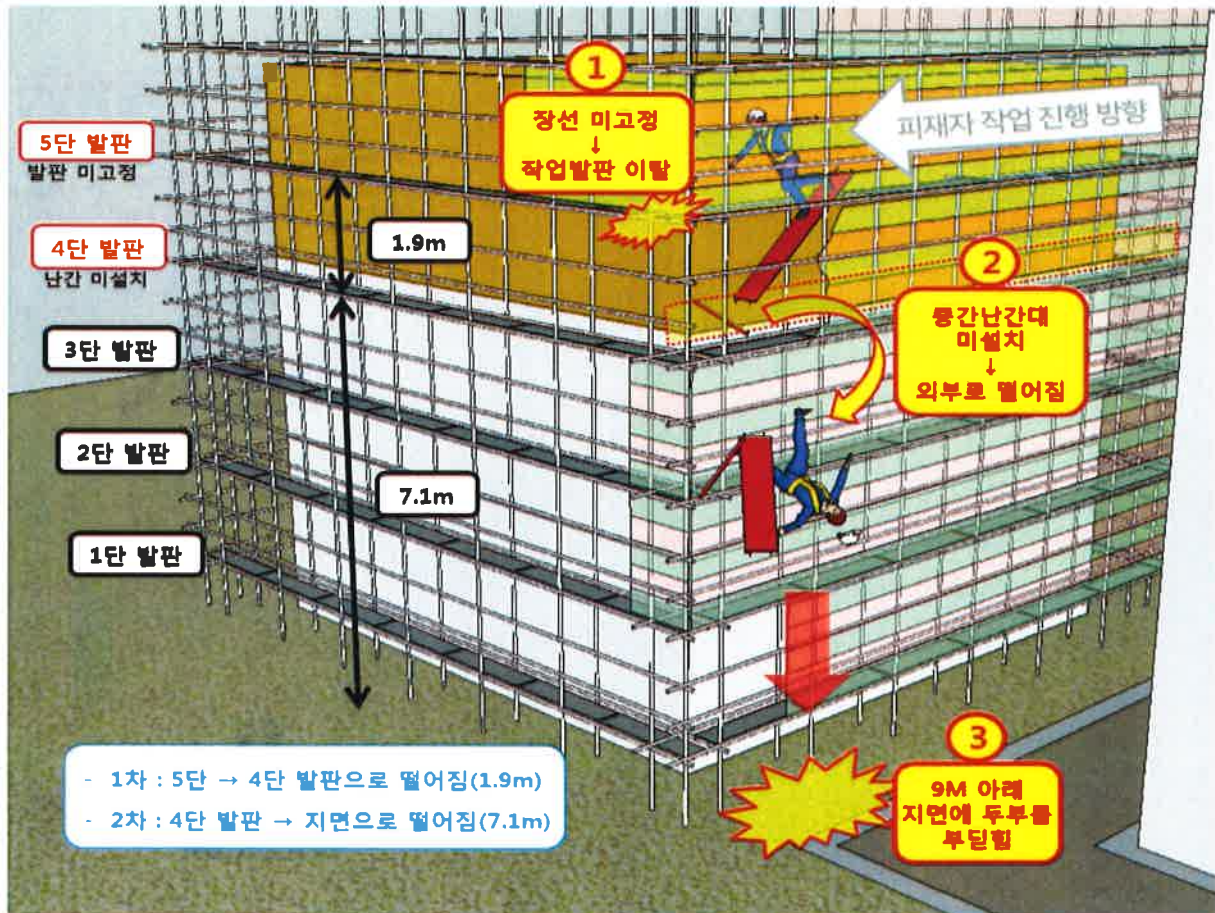

재해발생 원인 및 대책	○ 작업발판 고정 - 비계에 설치된 작업발판은 뒤집히거나, 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 고정 ※ 직교 클램프 등 전용 철물 사용을 권장. ○ 중간난간대 설치 - 근로자 추락 위험을 방지하기 위해 안전난간을 설치하는 경우, 상부 난간대와 바닥면의 1/2지점에 중간 난간대 설치
권장 사항	○ 안전대 지급 및 착용 - 쌍줄비계 작업발판 위에서 작업 시, 예상치 못한 부재 탈락 또는 비계 내측으로 추락 위험이 있으므로 안전대 지급 및 착용 권장 ○ 수직형 추락방망 설치 - 비계 외측에 안전인증 제품인 수직형 추락방망을 설치하여 추락재해 예방
