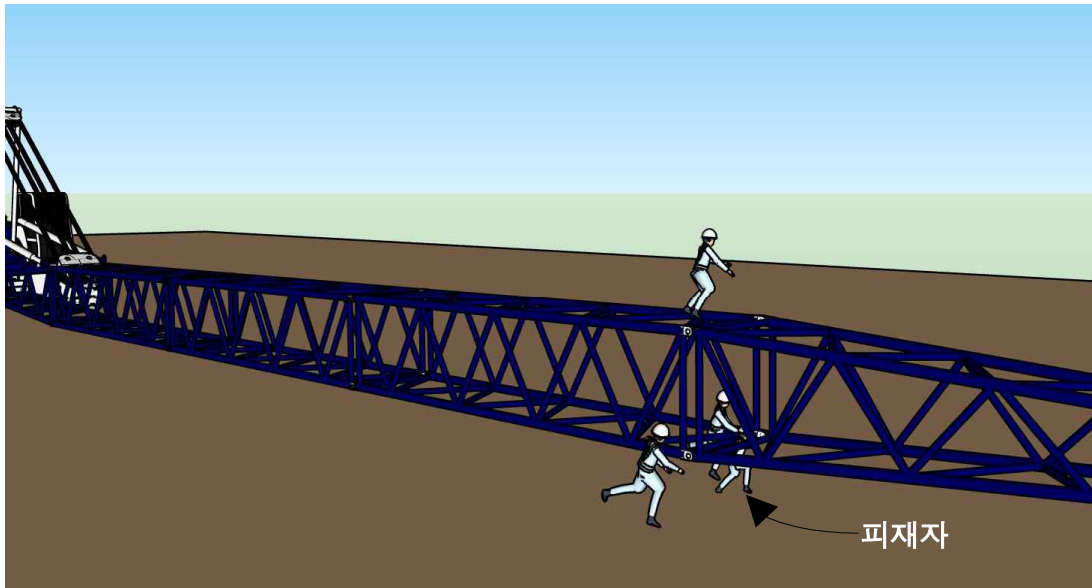


이동식 크레인 붐 해체작업 중 깔림			
공 사 명	고속국도 제00호선 건설공사	발생일시	2020.06.10.(수) 16:00경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	00시 00면	공사규모	총연장 L=3.8km
재해개요	- 2020.06.10.(수) 16:00분경 - 00시 00면 「고속국도 제00호선 건설공사」 현장에서, - 피해자가 이동식크레인(크롤러,150톤)의 붐 길이 조정작업을 위하여 마스트 고정핀을 해체하던 중, - 붐이 하강하면서 붐 하부에 있던 피해자가 깔려 사망한 재해임.		
재 해 상 황 도			
			
안전대책	○ 붐의 불시하강에 의한 위험방지조치 철저 - 크롤러 크레인의 해체작업 시 붐의 하부에 들어가는 경우, 갑작스러운 붐 하강에 의한 하중을 충분히 견딜 수 있는 안전지지대 또는 안전블럭을 설치하고 작업하여야 함 ○ 작업계획서 작성 및 준수 철저 - 크롤러 크레인의 해체작업 시 매뉴얼 등을 고려하여 적합한 작업계획을 수립하여야 하고, 이를 준수하여 작업하여야 함 ○ 신호체계 미수립 - 크롤러 크레인의 작업 시 사업주는 신호방법을 정하여 운전자와 근로자에게 신호하도록 하여야 함		
