


보 상부에서 철제계단 해체작업 중 떨어짐

공 사 명	○○프라자 인테리어 공사	발생일시	2019.09.16.(월) 09:54경
재해형태	떨 어 짐	재해정도	사망 1명
소 재 지	인천시 서구	공사규모	2개층 인테리어공사
재해개요	2019. 09. 16.(월) 09:54경 (주)00건설이 시공중인 인천시 서구 「00프라자 인테리어 공사」 현장에서 협력업체 (주)○○ 소속 근로자인 □□□ (만54세, 남, 잡철공)이 지상9층 보 상부에 서서 외부 철제계단 해체작업 중, 몸의 중심을 잃고 지상1층 바닥(H≒5.2m)으로 떨어져 병원으로 후송 치료 중, 재해발생당일 14:55경 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

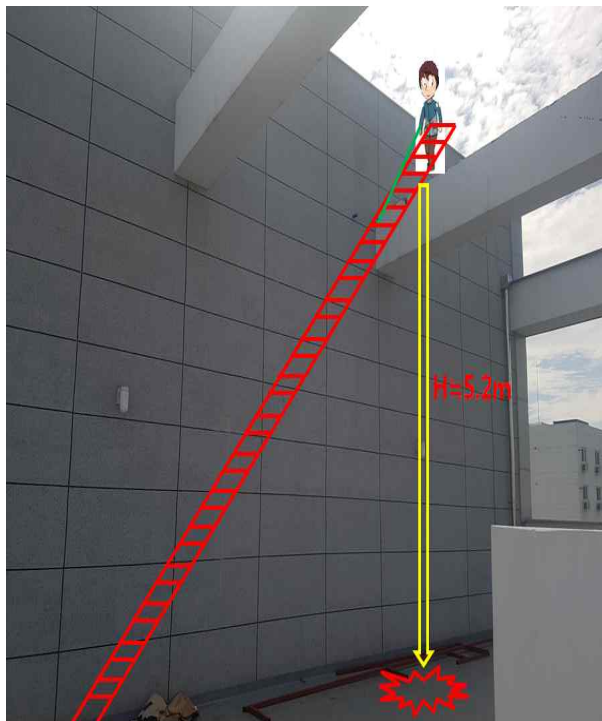

안전대책

○ 개구부 등의 방호 조치 철저


- 사업주는 철제계단을 해체하기 위하여 보 상부에 서서 작업을 하는 경우에는 추락을 예방하기 위하여 안전난간을 설치하여야 하고, 안전난간을 설치하는 것이 매우 곤란한 경우에는 추락방호망을 설치하여야 한다. 다만 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락할 위험을 방지하기 위한 조치를 하여야 함.

○ 개인보호구 착용 철저

- 사업주는 아래에 해당하는 작업을 할 때에는 작업조건에 맞는 보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 함.
가. 근로자가 추락할 위험이 있는 작업 : 안전모
나. 높이 2미터 이상의 추락할 위험이 있는 작업 : 안전대

○ 중량물 취급작업계획서 작성 및 준수

- 사업주는 약 245kg의 철제계단을 해체하는 등 중량물을 취급하는 작업을 하는 경우에는 작업계획서를 작성하고 해당 근로자에게 알려야 하며, 그 계획에 따라 작업을 하도록 하여야 함.

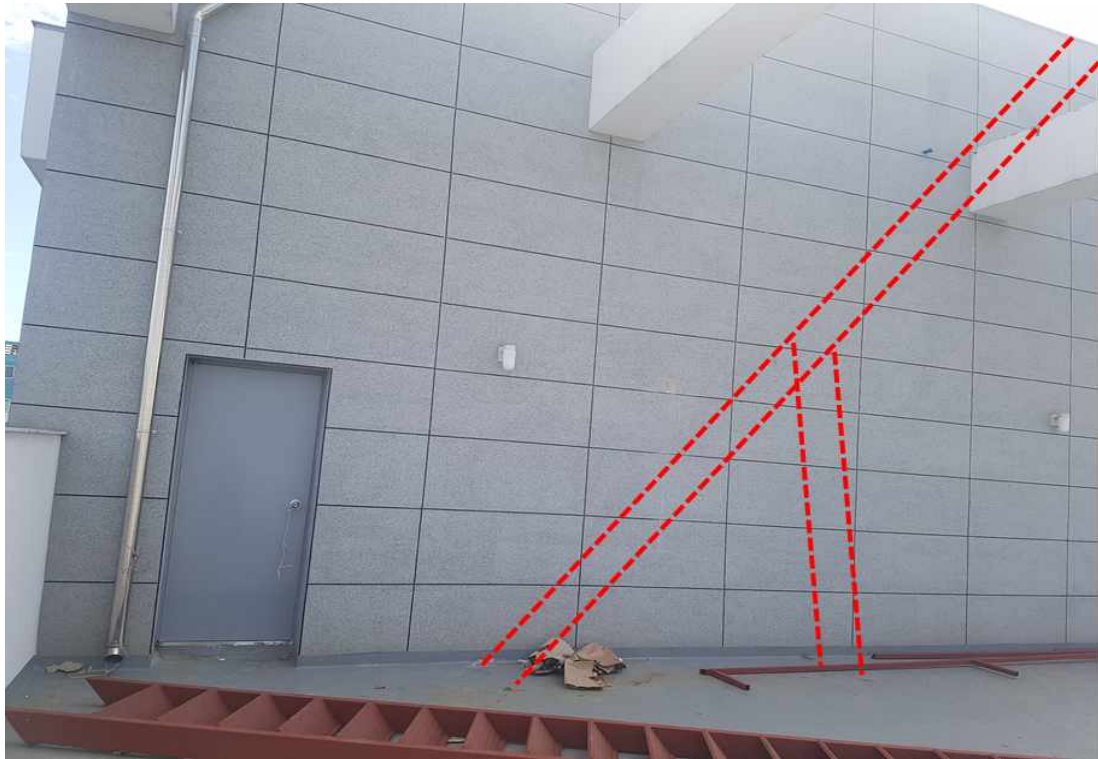

재해조사당시 지상9층 모습



재해조사당시 옥탑층에서 바라본 지상9층 모습
